


Fase	Nombre	Duración base (días)	Factor de ajuste
F1	Alineación legal y reglamentaria	90	1,0
F2	Negociación y ajuste contractual con concesionario	120	1,0
F3	Diseño y validación de instrumentos	75	1,0
F4	Selección de piloto	60	1,0
F5	Implementación física del piloto	90	1,0
F6	Operación y monitoreo del piloto	180	1,0
F7	Evaluación del piloto, ajustes técnicos y normativos	60	1,0
F8	Escalamiento 12–24 meses a la ZM	240	1,0

Nota: Modifique el factor de ajuste para recalcular automáticamente el Gantt. Ejemplo: 0.8 = compresión 20%, 1.2 = extensión 20%.

Fase	Código	Actividad	Responsable principal	Responsable secundario	Dependencia	Fecha inicio	Duración (días)	Fecha fin
F1	F1.A1	Revisión del marco jurídico vigente	Municipio	Consultoría		01/07/2026	15	15/07/2026
F1	F1.A2	Redacción de propuesta de reforma al Reglamento de Aseo	Consultoría	Municipio	F1.A1	16/07/2026	30	14/08/2026
F1	F1.A3	Consulta jurídica y dictamen de viabilidad	Municipio		F1.A2	15/08/2026	20	03/09/2026
F1	F1.A4	Aprobación en Cabildo	Municipio		F1.A3	04/09/2026	25	28/09/2026
F2	F2.A1	Diagnóstico del contrato de concesión vigente	Consultoría	Municipio	F1.A4	29/09/2026	20	18/10/2026
F2	F2.A2	Diseño de cláusulas de valorización y separación	Consultoría	Concesionario	F2.A1	19/10/2026	30	17/11/2026
F2	F2.A3	Mesas de negociación Municipio–Concesionario	Municipio	Concesionario	F2.A2	18/11/2026	45	01/01/2027
F2	F2.A4	Firma de adéndum o nuevo convenio	Municipio	Concesionario	F2.A3	02/01/2027	25	26/01/2027
F3	F3.A1	Elaboración de cédulas de idoneidad	Consultoría		F2.A4	27/01/2027	20	15/02/2027
F3	F3.A2	Diseño de lineamiento técnico operativo	Consultoría	Municipio	F3.A1	16/02/2027	25	12/03/2027
F3	F3.A3	Validación técnica con actores clave	Consultoría	Municipio	F3.A2	13/03/2027	15	27/03/2027
F3	F3.A4	Ajustes finales y aprobación de instrumentos	Municipio	Consultoría	F3.A3	28/03/2027	15	11/04/2027
F4	F4.A1	Aplicación de cédulas en residenciales candidatos	Consultoría	Administración	F3.A4	12/04/2027	25	06/05/2027
F4	F4.A2	Evaluación y ranking de sitios piloto	Consultoría	Municipio	F4.A1	07/05/2027	15	21/05/2027
F4	F4.A3	Acuerdo formal con administraciones seleccionadas	Municipio	Administración	F4.A2	22/05/2027	20	10/06/2027
F5	F5.A1	Adquisición e instalación de contenedores	Concesionario	Municipio	F4.A3	11/06/2027	30	10/07/2027
F5	F5.A2	Instalación de señalética y material informativo	Consultoría	Administración	F5.A1	11/07/2027	15	25/07/2027
F5	F5.A3	Habilitación de centros de acopio	Concesionario	Municipio	F5.A1	11/07/2027	25	04/08/2027
F5	F5.A4	Capacitación a administraciones y personal	Consultoría	Administración	F5.A2	26/07/2027	20	14/08/2027
F6	F6.A1	Arranque de recolección diferenciada	Concesionario	Municipio	F5.A4	15/08/2027	10	24/08/2027
F6	F6.A2	Monitoreo semanal de indicadores	Consultoría	Municipio	F6.A1	25/08/2027	150	21/01/2028
F6	F6.A3	Reportes mensuales de desempeño	Consultoría	Municipio	F6.A1	25/08/2027	170	10/02/2028
F6	F6.A4	Capacitación continua y ajustes operativos	Consultoría	Administración	F6.A1	25/08/2027	170	10/02/2028
F7	F7.A1	Evaluación integral del piloto	Consultoría	Municipio	F6.A2	22/01/2028	25	15/02/2028
F7	F7.A2	Propuesta de ajustes técnicos y normativos	Consultoría	Municipio	F7.A1	16/02/2028	20	06/03/2028
F7	F7.A3	Validación de ajustes y aprobación de escalamiento	Municipio		F7.A2	07/03/2028	15	21/03/2028
F8	F8.A1	Diseño de plan de escalamiento a la ZM	Consultoría	Municipio	F7.A3	22/03/2028	40	30/04/2028
F8	F8.A2	Negociación con municipios conurbados	Municipio	Consultoría	F8.A1	01/05/2028	60	29/06/2028
F8	F8.A3	Despliegue gradual en nuevas zonas	Concesionario	Municipio	F8.A2	30/06/2028	90	27/09/2028
F8	F8.A4	Monitoreo y ajuste continuo	Consultoría	Municipio	F8.A3	28/09/2028	50	16/11/2028

Riesgo clave	Estado	01-jul	08-jul	15-jul	22-jul	29-jul	05-ago	12-ago	19-ago	26-ago	02-sept	09-sept	16-sept	23-sept	30-sept	07-oct	14-oct	21-oct	28-oct	04-nov	11-nov	18-nov	25-nov	02-dic	09-dic	16-dic	23-dic	30-dic	06-ene	13-ene	20-ene	27-ene	03-feb	10-feb	17-feb	24-feb	03-mar	10-mar	17-mar	24-mar	31-mar	07-abr	14-abr	21-abr	28-abr
	No iniciado																																												
	No iniciado																																												
Retraso en dictamen	No iniciado																																												
Calendario legislativo	No iniciado																																												
	No iniciado																																												
Resistencia del concesionario	No iniciado																																												
	No iniciado																																												
	No iniciado																																												
	No iniciado																																												
	No iniciado																																												
	No iniciado																																												
	No iniciado																																												
	No iniciado																																												
	No iniciado																																												
Rechazo de administraciones	No iniciado																																												
Demora en licitación	No iniciado																																												
	No iniciado																																												
	No iniciado																																												
	No iniciado																																												
Baja participación inicial	No iniciado																																												
	No iniciado																																												
	No iniciado																																												
	No iniciado																																												
	No iniciado																																												
	No iniciado																																												
Cambio de gobierno	No iniciado																																												
	No iniciado																																												
Coordinación intermunicipal	No iniciado																																												
	No iniciado																																												
	No iniciado																																												

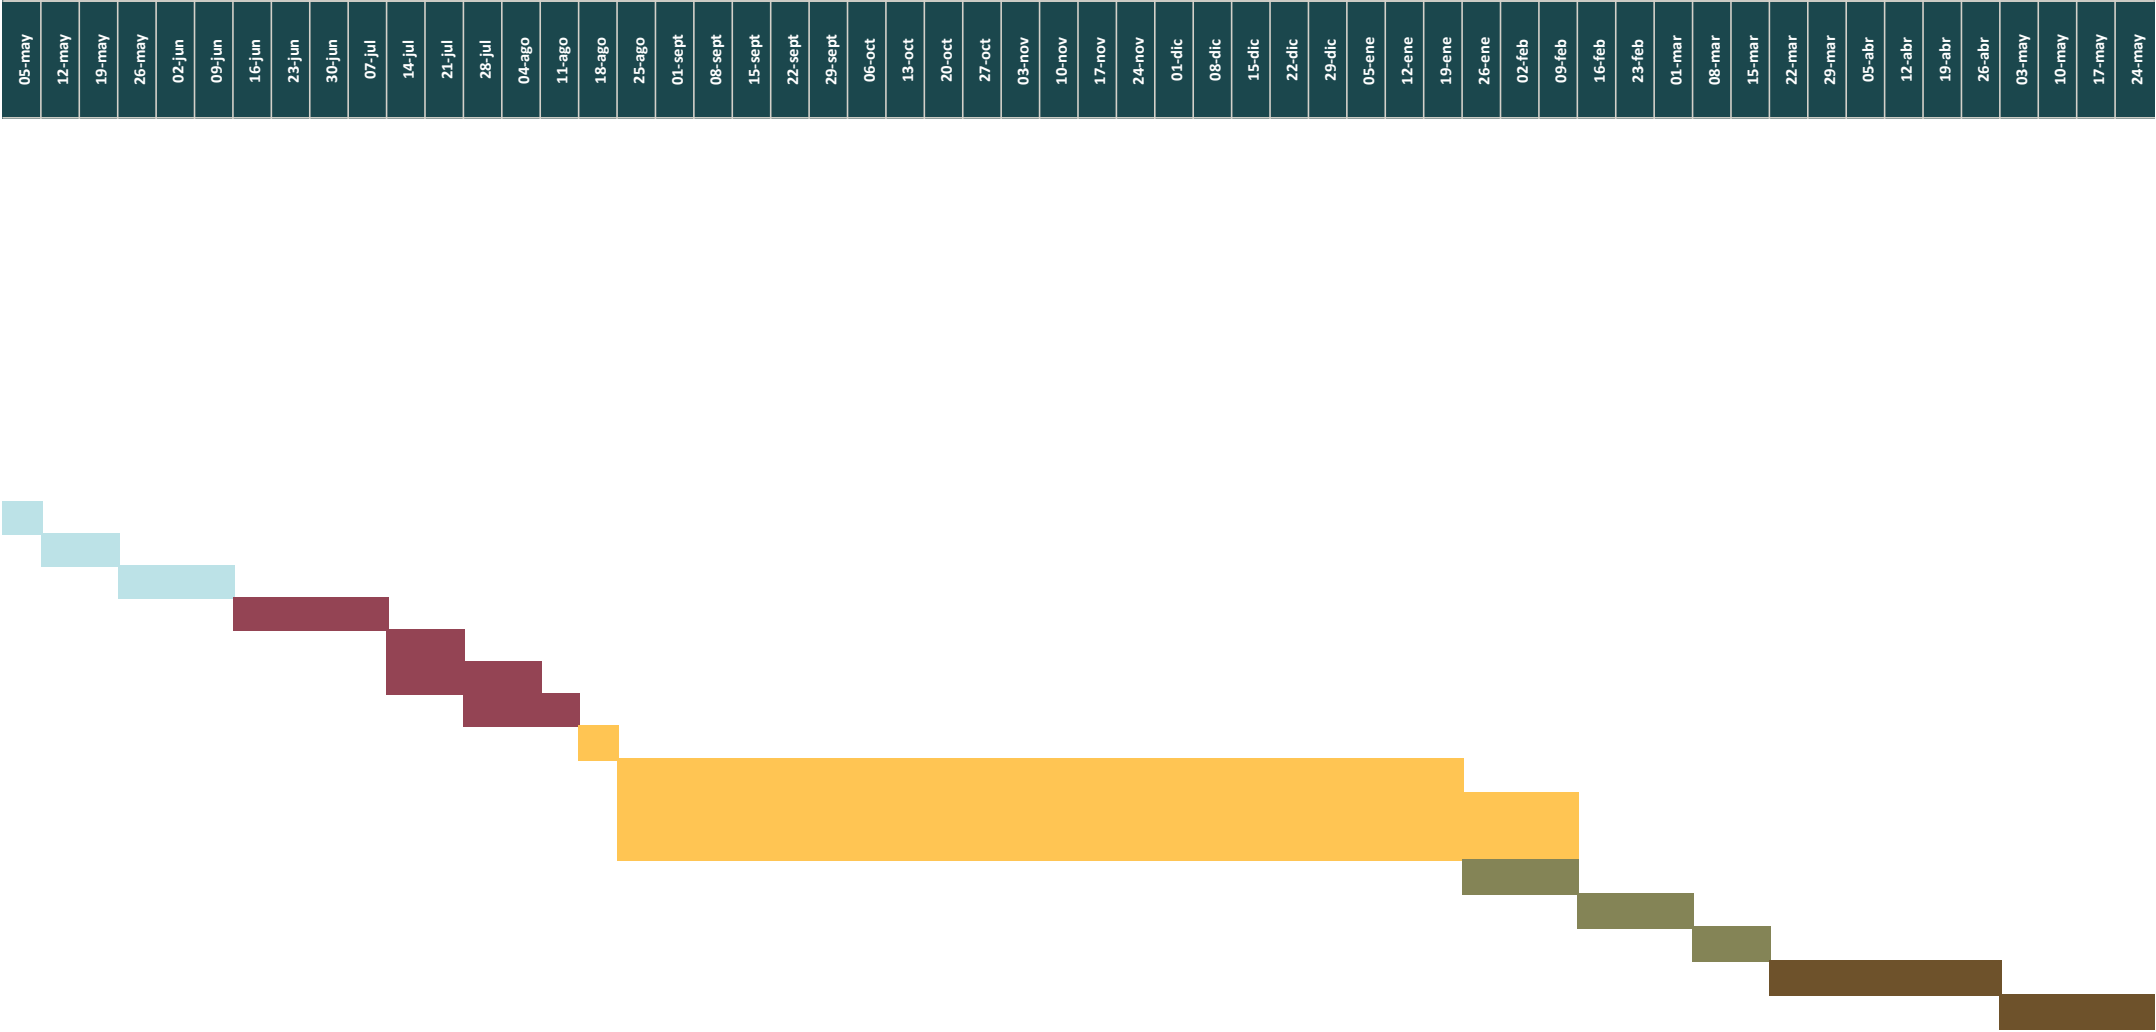

31-may
07-jun
14-jun
21-jun
28-jun
05-jul
12-jul
19-jul
26-jul
02-ago
09-ago
16-ago
23-ago
30-ago
06-sept
13-sept
20-sept
27-sept
04-oct
11-oct

